

기밀성능 시험 성적서

Building Airtightness Test Report

KS L ISO 9972

팬 가압법 (Fan pressurization method)

시험 종류 감압 시험 기간 26/07/17 00:00:00~00:10:00

시험 정보

시험 목적	-	시험 위치	-
시험 방법	-	의뢰자	-
설계자	-	시험자	-
시공자	-	실내 체적	1,000 m³
연면적	-	구조	-


주요 결과 (50 Pa 기준)

ACH50 1.38 1/h 시간당 공기교환횟수 · 감압 기준	Q50 1,382.2 m³/h 50 Pa 기준 누기량 · 감압 기준	AL50 0.0419 m² 누기 면적 · 감압 기준
---	---	------------------------------------

상세 결과

항목	감압	가압	단위
누기량 (50 Pa)	1,382.2	-	m³/h
공기교환횟수	1.38	-	1/h
누기 면적 (50 Pa)	0.0419	-	m²
보정 누기 계수 C _o	263.36	-	m³/(h·Pa ⁿ)
기류 지수 n	0.424	-	-
결정 계수 R²	0.9946	-	-

누기 그래프

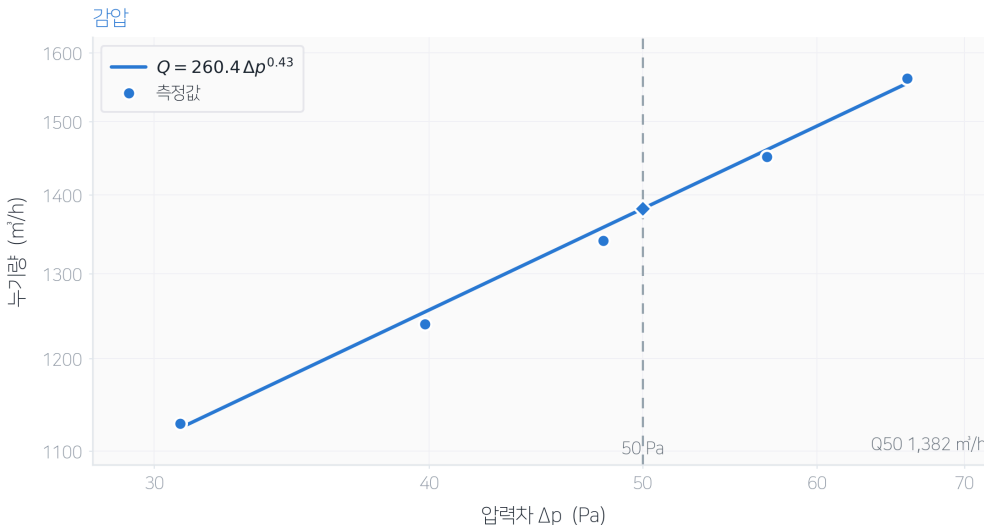

본 성적서는 KS L ISO 9972 절차에 따라 측정·산출되었습니다.
